

## BASE DE CONTROL DE VECTORES. Pcia de CATAMARCA

PLANILLA DE RESUMEN		MES						
ITEM	DESIGNACION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1	CAPITULO 01: Trabajos Preliminares	100%						
2	CAPITULO 02: Demoliciones	60%	40%					
3	CAPITULO 03: Mov. De suelos		60%	40%				
4	CAPITULO 04: Fundaciones y Estructura de Hormigón Armado			50%	50%			
5	CAPITULO 05: Estructura Metálica y Cubierta				50%	25%	25%	
6	CAPITULO 06: Mampostería y tabiquería		40%			40%	20%	
7	CAPITULO 07: Contrapisos y carpetas		20%			20%	60%	
8	CAPITULO 08: Aislaciones					100%		
9	CAPITULO 09: Cielorrasos						50%	50%
10	CAPITULO 10: Revoques y enlucidos		50%			50%		
11	CAPITULO 11: Solados y zócalos			20%			60%	20%
12	CAPITULO 12: Revestimientos			50%			50%	
13	CAPITULO 13: Carpinterías		30%				70%	
14	CAPITULO 14: Vidrios							100%
15	CAPITULO 15: Pinturas							100%
16	CAPITULO 16: Mesadas							100%
17	CAPITULO 17: Zinguería					100%		
18	CAPITULO 18: Limpieza de obra	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
19	CAPITULO 19: Ayuda de gremios		15%	15%	15%	15%	15%	25%
20	CAPITULO 20: Instalación sanitaria y Provisión agua		30%			50%		20%
21	CAPITULO 21: Instalación de gas							
22	CAPITULO 22: Instalación Eléctrica		30%			50%		20%
23	CAPITULO 23: Artefactos de Iluminación							100%
24	CAPITULO 24: Instalación Termomecánica							100%
25	CAPITULO 25: Señalética							100%
26	CAPITULO 26: Instalación contra Incendios							100%
<b>TOTAL GENERAL :</b>								


# BASE DE CONTROL DE VECTORES. Pcia de CATAMARCA



PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS



## CURVA DE INVERSIÓN

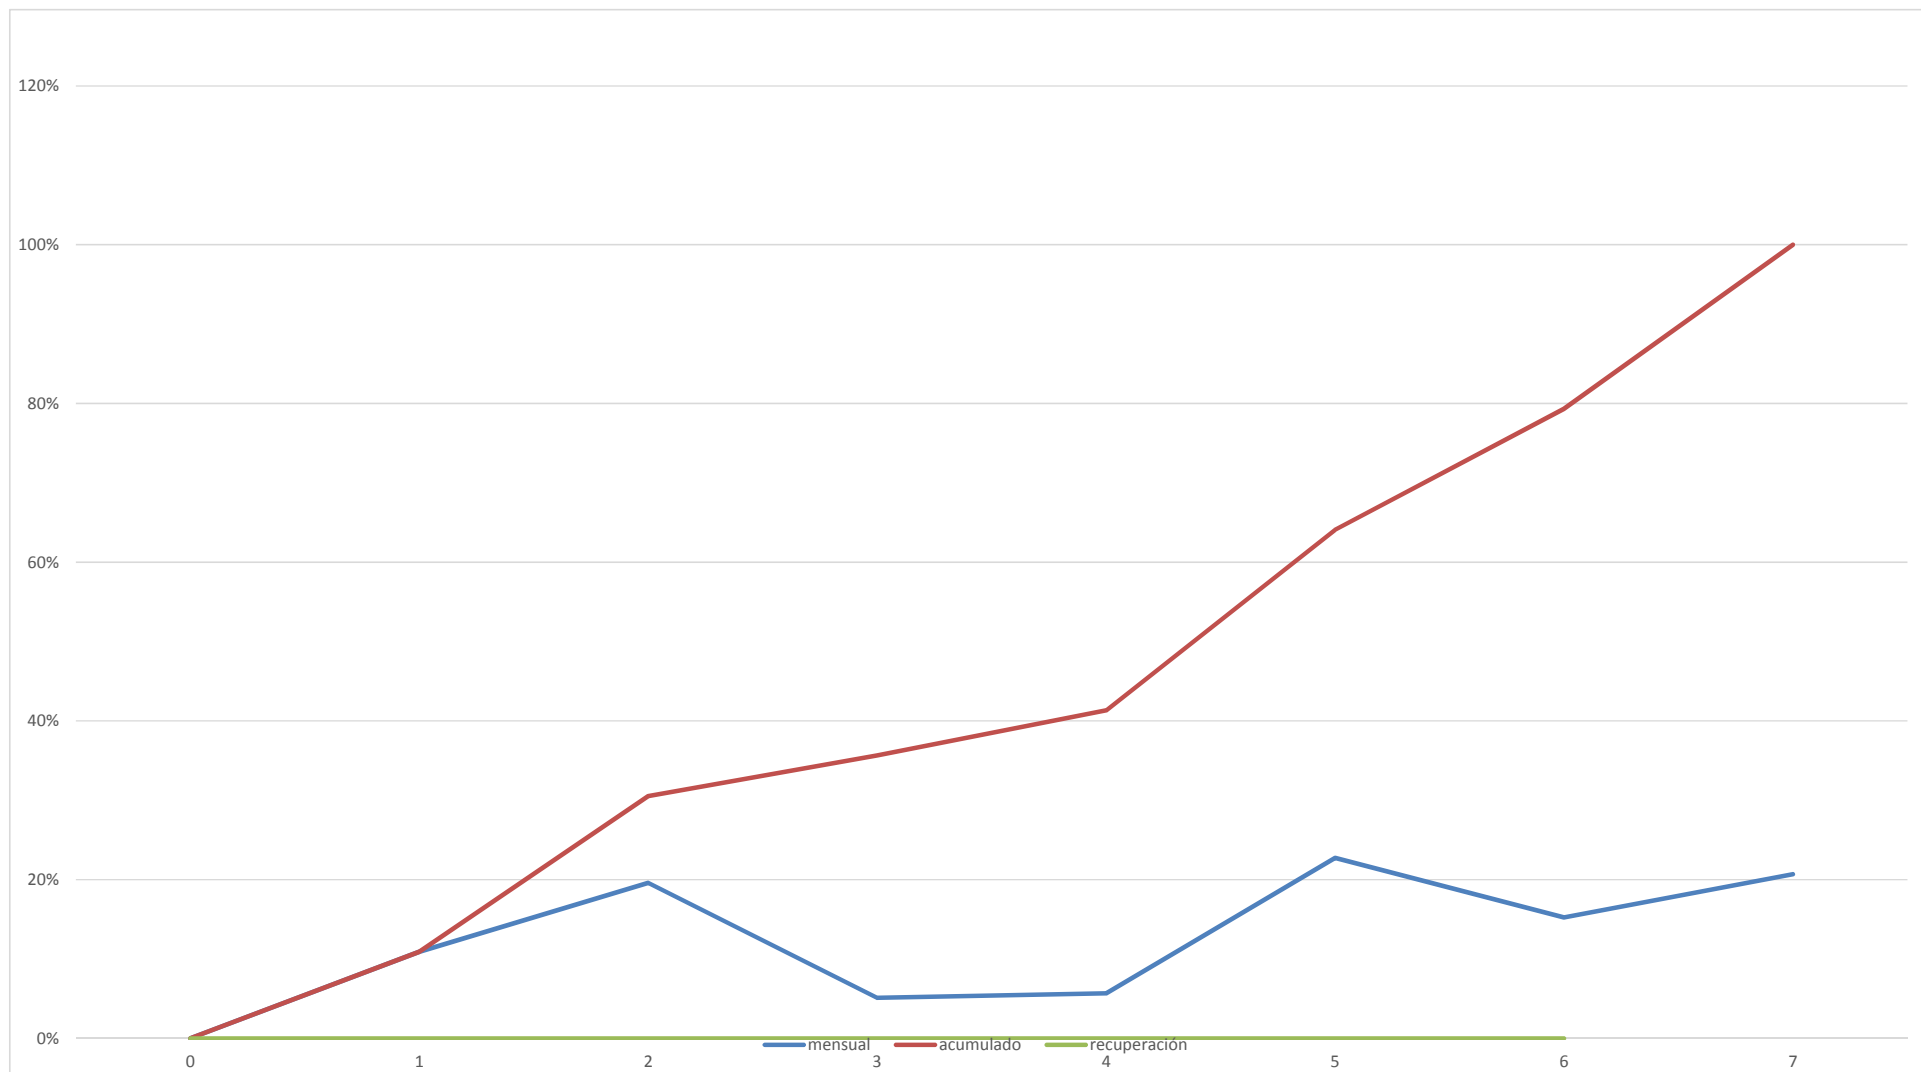

## LISTADO DE ARTEFACTOS GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ARTEFACTO	CANTIDAD	MARCA REF similar o equiv	DESCRIPCIÓN	Ubicación
Tanque de reserva 3000 Lts	1	Rotoplas	Tanque de reserva 3000 Lts	Azotea módulo vestuarios
Termotanque eléctrico 120 Lts	1	Rheem	Termotanque alimentacion agua caliente vestuarios	Vestuario
Indoro Ferrum Bari c/ mochila	7	Ferrum	Inodoro Bari largo c/ depósito dual	Baño interior y Vestuario
Cuadro de ducha grifería FV Kansas	4	FV	Cuadro de ducha grifería FV Kansas	Vestuario
Mingitorio Ferrum	2	Ferrum	Mingitorio Ferrum	Vestuario
Válvula descarga mingitorio	1	FV	Válvula descarga Mingitorio FV Ecomatic 373.01	Vestuario
Bacha lavatorio con pie 1 agujero	3	Ferrum	Bacha lavatorio con pie Ferrum Andina 1 agujero	Baño interior
Grifería lavatorio FV Pressmatic	7	FV	Grifería lavatorio PressMatic 0361.02 cromo	Baño interior y Vestuario
Grifería para mesada con pico movil alto, solo agua fria	4	FV	Grifería para mesada con pico movil alto FV Allegro	Lavado
Bacha oval acero inoxidable bajo mesada 32x44x13	4	Mi Pileta 456	Pileta de acero aisi 304 18/10 tipo Mi Pileta mod. 456	Vestuario
Pileton 85X50x30 de acero inoxidable	4	Johnson	Pileton 85X50x30 de acero inoxidable AISI 304	Lavado
Llave de paso de agua	6	Acquasystem	Llave de paso de agua	Baño interior , Lavado y Vestuario
Dispenser de jabón liq	5	Valot	Dispenser de jabón líquido	Baño interior , Lavado y Vestuario
Dispenser de toallas	5	Valot	Dispenser de toallas	Baño interior , Lavado y Vestuario
Dispenser de Papel higiénico	7	Valot	Dispenser de Papel higiénico	Baño interior y Vestuario
Cesto de basura	5	Elite	Cesto de basura con tapa basculante	Baño interior , Lavado y Vestuario
Espejo	4	Ferrum	Espejo float 6 mm 50 x 70	Baño interior y Vestuario
Percha	7	FV	Percha línea Libby modelo 166/39	Baño interior y Vestuario

**BASE DE CONTROL DE VECTORES  
CATAMARCA**



PROGRAMA NACIONAL  
DE CHAGAS



	Superficie semicubierta (m2)	Superficie descubierta (m2)	Superficie cubierta (m2)
01- Oficina UPCN			14,10
02- Baño Público			12,75
03- Recepción de Muestras			6,17
04- Registro y Notificación			12,51
05- Sala de espera			16,28
06- Laboratorio de Parasitología			12,96
07- Insectario			44,37
08- Paso			13,74
09- Módulo de Vestuarios		31,73	40,67
10- Módulo de Lavado y Depósito	25,79		29,54
11- Playón		234,53	
Superficie de tabiquería de Durlock			7,10
<b>TOTALES</b>	<b>25,79</b>	<b>266,26</b>	<b>203,09</b>

100% cubierta	203,09
50% semicubierta	12,90
33% descubierta	88,75
	<b>304,74</b>
